TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1-4 / 2020

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelun valmistelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Hankkeen nimi	TA 2020		1.1.2020-30.4.2020 Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä	Huom
RAKENNUKSET, PIHAT JA AIDAT YHTI	**12 340 000**		**1 819 668**	**15**	**10 520 332**	
RAKENNUKSET	**12 240 000**		**1 819 668**	**15**	**10 420 332**	
KUNNANHALLITUS	**250 000**		**3 271**	**1**	**246 729**	
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, LVIS ja ikkunat	200 000		1 271	1	198 729	
Prijuutti	50 000		2 000	4	48 000	
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	**8 140 000**		**523 051**	**6**	**7 616 949**	
Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO	3 800 000		137 691	4	3 662 309	
Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	400 000		2 701	1	397 299	
Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	30 000		0	0	30 000	
Kirkonkylän koulukampus	1 000 000		40 241	4	959 759	
Martta Wendelin päiväkoti	1 400 000		219 739	16	1 180 261	
Kellokosken koulun alapohjien korjaus	250 000		2 653	1	247 347	
Rykmentinpuiston monitoimikampus	100 000		20 646	21	79 354	
Riihikallion monitoimikampus	500 000		67 789	14	432 211	
Jokela koulukeskus	50 000		14 976	30	35 024	
Hyrylän ostoskeskuksen muutokset	50 000		1 110	2	48 890	
Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus	500 000		5 465	1	494 535	
Lahelan monitoimikampus	60 000		10 040	17	49 960	

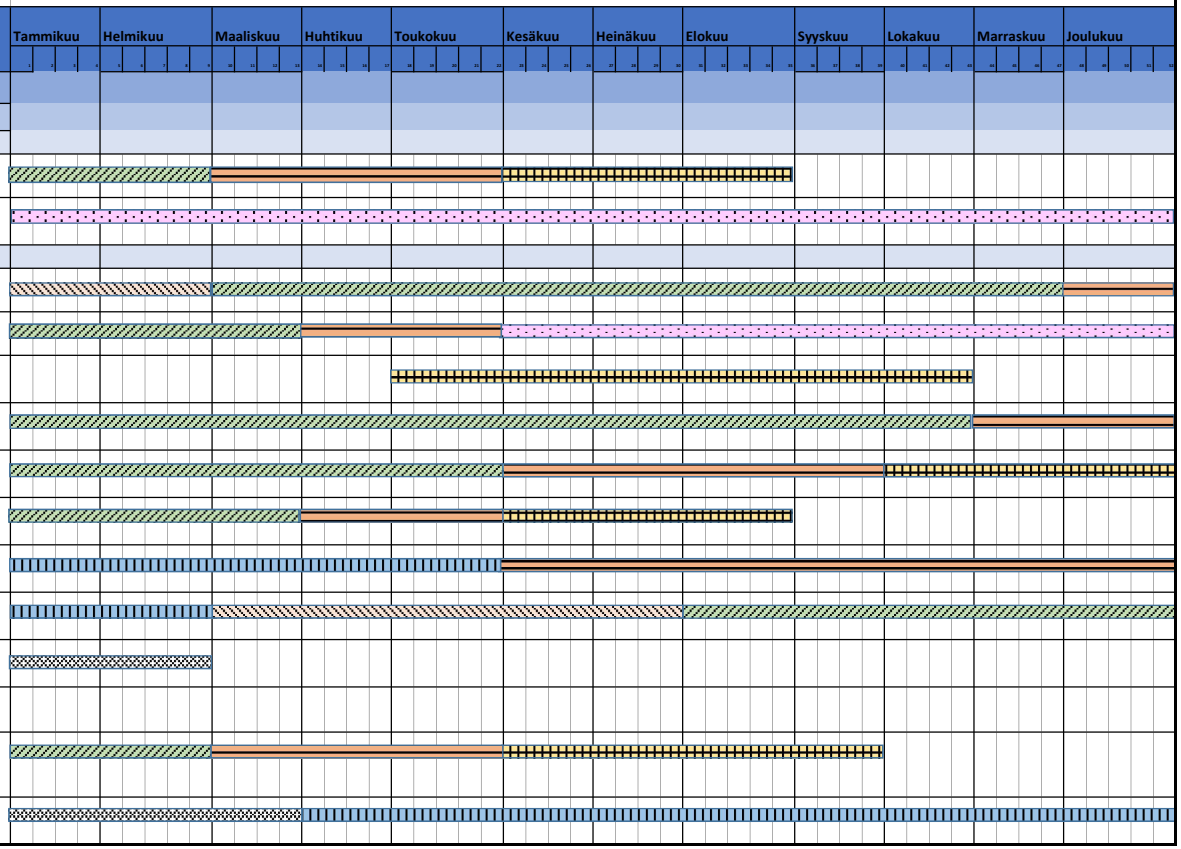

TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1-4 / 2020

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelun valmistelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Hankkeen nimi	TA 2020		1.1.2020-30.4.2020 Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä	Huom
KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	**1 540 000**		**172 348**	**11**	**1 367 652**	
Urheilukeskus	300 000		161 691	54	138 309	
Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen	15 000		1 793	12	13 207	
Halosenniemi	100 000			0	100 000	
Ilmatorjuntamuseo	25 000		2 535	10	22 465	
Rakennus 10	40 000			0	40 000	
Mesta	10 000			0	10 000	
Jokelan tiilitehtaan kehittäminen	50 000		872	2	49 128	
Kirjasto, Kellokosken toimipiste	25 000			0	25 000	
Taidekasarmi	25 000			0	25 000	
Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat	400 000		5 160	1	394 840	
BMX-rata, hankesuunnitelma	50 000			0	50 000	
Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat	150 000			0	150 000	
Tuusulan jäähallin laatan ja jäähdytysputkiston uusiminen	350 000			0	350 000	

TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1-4 / 2020

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelun valmistelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Hankkeen nimi	TA 2020		1.1.2020-30.4.2020 Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä	Huom	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
TEKNINEN LAUTAKUNTA	**2 310 000**		**1 120 998**	**49**	**1 189 002**	**erillinen työohjelma 2 630 000 € + Tuuskodon peruskorjaus 100 000 € + Sahankulman muutostyöt 80 000 €=2 810 000 €**												
Hyrylän koulukeskuksen korjauksia	280 000		87 740	31	192 260													
ANTTILAN ALUEEN RAKENNUKSET	100 000		6 170	6	93 830													
TALOAUTOMAATION PARANNUS- JA UUSIMISTYÖT	100 000		38 730	39	61 270													
VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOSINVESTOINNIT	50 000		17 041	34	32 959													
KIINTEISTÖJEN ESTEETÖMYYDEN PARANTAMISEEN KOHD. ERILLSTYÖT	50 000		14 753	30	35 247													
ENERGIATEHOKK. PARANTAMISEEN KOHDISTUVAT ERILLISTYÖT	150 000		63 141	42	86 859													
PTS:N MUKAISET TYÖT	900 000		81 720	9	818 280													
LVIS-PARANNUSTYÖT	200 000		72 098	36	127 902													
KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMINEN , ASIANTUNTIJAPALV.	100 000			0	100 000													
Tuuskodon peruskorjaus	100 000		527 123	527	-427 123													
Sahankulman muutostyöt	80 000		169 059	211	-89 059													
Siivouskeskusten päivitys	50 000		3 093	6	46 907													
Syväkeräyssäiliöiden asentaminen jätteille	50 000			0	50 000													
Valvonta- ja lukitusjärjestelmät	100 000		40 330	40	59 670													
PIHAT	**100 000**		**0**	**0**	**100 000**													
Rakennusten pihainvestoinnit	100 000			0	100 000													
