TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1-8 / 2020

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelun valmistelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Hankkeen nimi	TA 2020	Muutos OVK2	MTA 2020	1.1.2020-31.8.2020 Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä	Huom
RAKENNUKSET, PIHAT JA AIDAT YHTEENSÄ	**12 340 000**	**-2 250 000**	**10 090 000**	**4 593 962**	**46**	**5 496 038**	
RAKENNUKSET	**12 240 000**	**-2 250 000**	**9 990 000**	**4 519 549**	**45**	**5 470 451**	
KUNNANHALLITUS	**250 000**	**0**	**250 000**	**95 909**	**38**	**154 091**	
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, LVIS ja ikkunat	200 000		200 000	85 720	43	114 280	
Prijuutti	50 000		50 000	10 189	20	39 811	
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	**8 140 000**	**-3 000 000**	**5 140 000**	**1 868 063**	**36**	**3 271 937**	
Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO	3 800 000	-2 500 000	1 300 000	461 531	36	838 469	
Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	400 000		400 000	304 504	76	95 496	
Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	30 000		30 000	21 181	71	8 819	
Kirkonkylän koulukampus	1 000 000		1 000 000	232 407	23	767 593	
Martta Wendelin päiväkoti	1 400 000		1 400 000	467 642	33	932 358	
Kellokosken koulun alapohjien korjaus	250 000		250 000	194 435	78	55 565	Valmis
Rykmentinpuiston monitoimikampus	100 000		100 000	85 751	86	14 249	
Riihikallion monitoimikampus	500 000		500 000	71 853	14	428 147	
Jokela koulukeskus	50 000		50 000	17 609	35	32 391	
Hyrylän ostoskeskuksen muutokset	50 000		50 000	1 110	2	48 890	
Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus	500 000	-500 000	0				Siirtyy vuodelle 2021 resurssipulan vuoksi
Lahelan monitoimikampus	60 000		60 000	10 040	17	49 960	

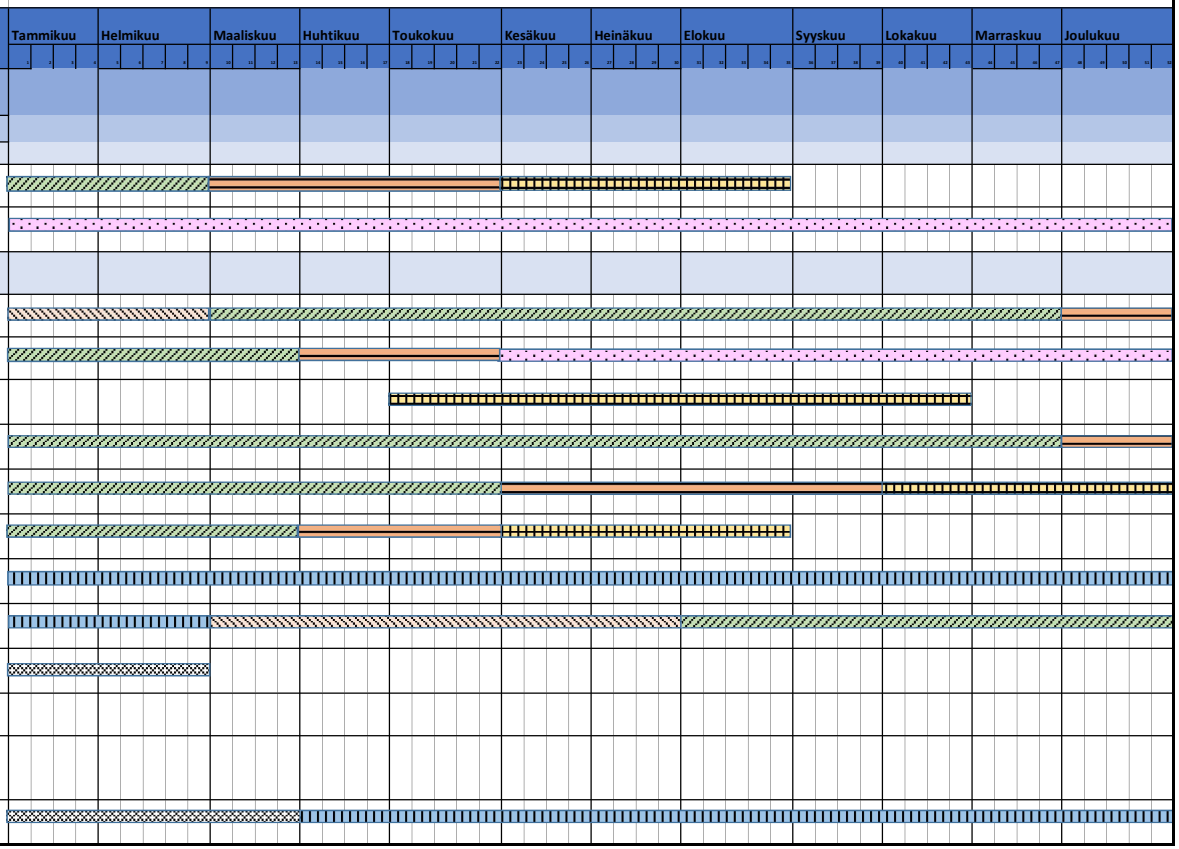

TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1-8 / 2020

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelun valmistelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Hankkeen nimi	TA 2020	Muutos OVK2	MTA 2020	1.1.2020-31.8.2020 Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä	Huom
KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	**1 540 000**	**0**	**1 540 000**	**476 647**	**31**	**1 063 353**	
Urheilukeskus	300 000		300 000	228 097	76	71 903	
Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen	15 000		15 000	14 944	100	56	Valmis
Halosenniemi	100 000		100 000		0	100 000	
Ilmatorjuntamuseo	25 000		25 000	2 988	12	22 012	
Rakennus 10	40 000		40 000	8 951	22	31 049	
Mesta	10 000		10 000		0	10 000	
Jokelan tiilitehtaan kehittäminen	50 000		50 000	3 628	7	46 372	
Kirjasto, Kellokosken toimipiste	25 000		25 000	3 930	16	21 070	
Taidekasarmi	25 000		25 000		0	25 000	
Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat	400 000		400 000	11 012	3	388 988	
BMX-rata, hankesuunnitelma	50 000		50 000	7 299	15	42 701	
Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat	150 000	-150 000	0			0	Siirtyy vuodelle 2021 resurssipulan vuoksi
Tuusulan jäähallin laatan ja jäähdytysputkiston uusiminen	350 000		350 000	195 501	56	154 499	Valmis

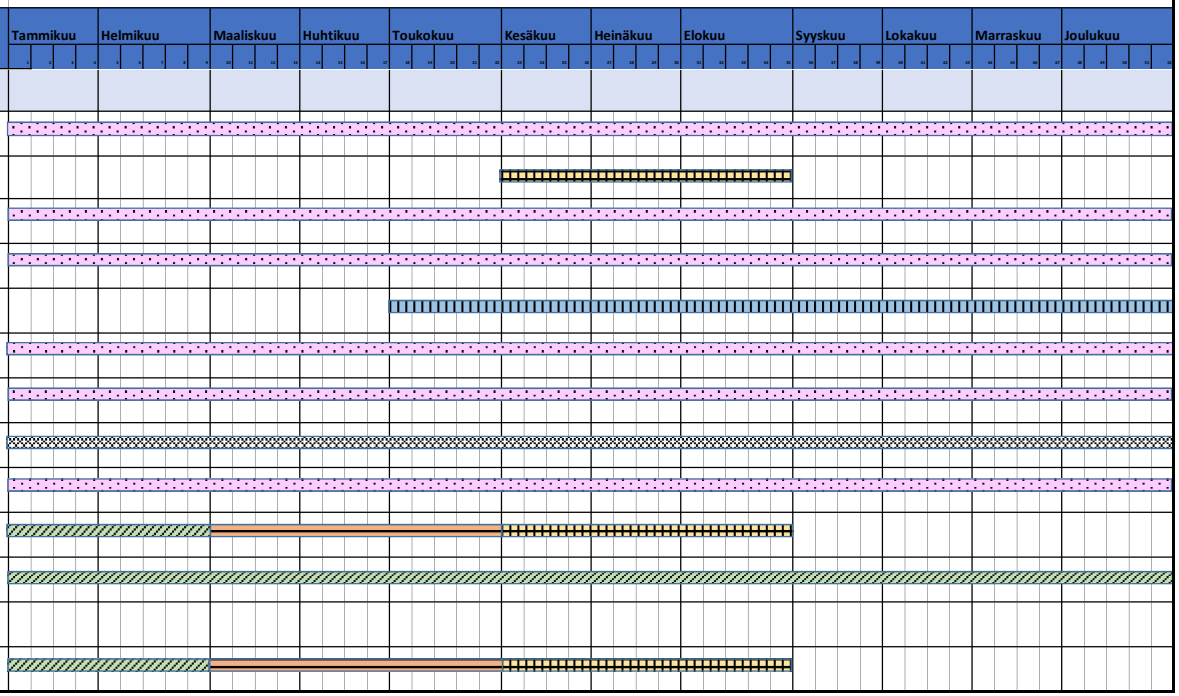

TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1-8 / 2020

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelun valmistelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen
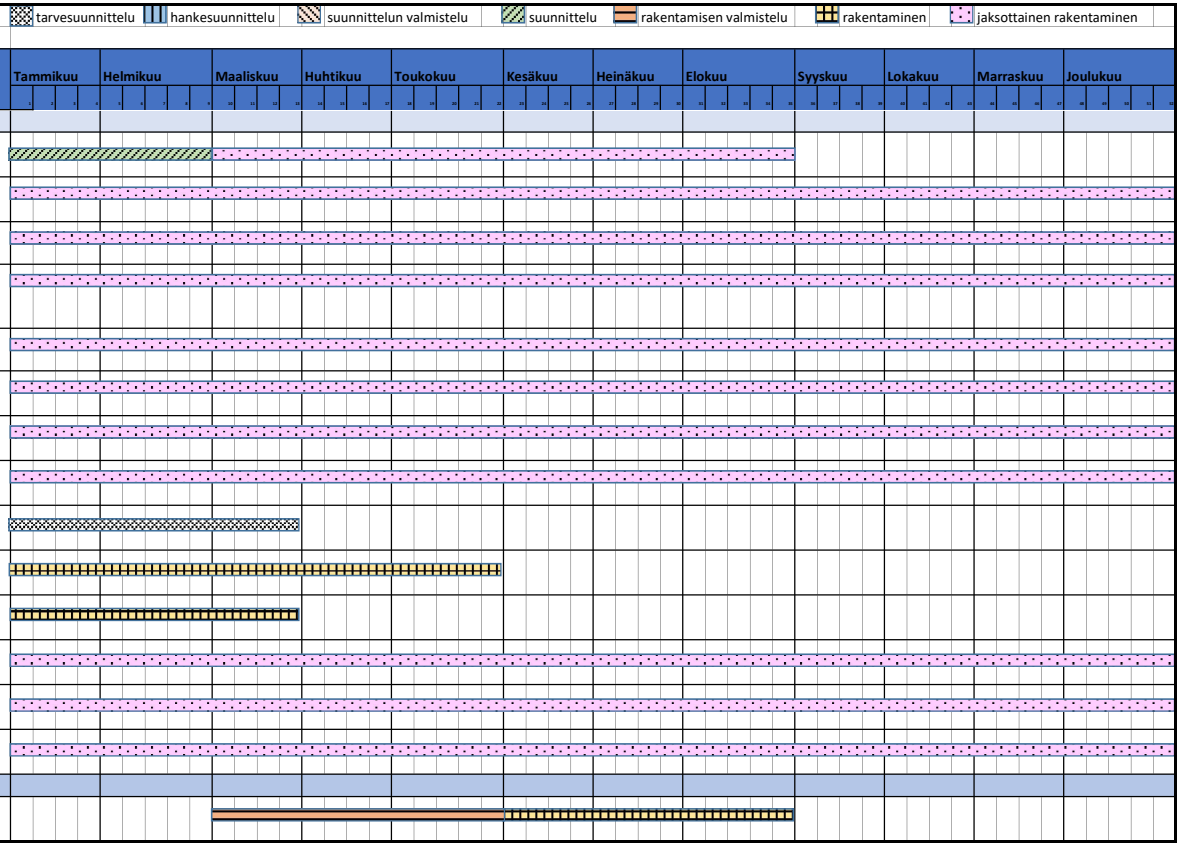
Hankkeen nimi	TA 2020	Muutos OVK2	MTA 2020	1.1.2020-31.8.2020 Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä	Huom
TEKNINEN LAUTAKUNTA	**2 310 000**	**750 000**	**3 060 000**	**2 078 930**	**68**	**981 070**	
Hyrylän koulukeskuksen korjauksia	280 000		280 000	279 297	100	703	
ANTTILAN ALUEEN RAKENNUKSET	100 000		100 000	38 902	39	61 098	
TALOAUTOMAATION PARANNUS- JA UUSIMISTYÖT	100 000		100 000	68 729	69	31 271	
VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOSINVESTOINNIT	50 000		50 000	25 080	50	24 920	
KIINTEISTÖJEN ESTEETÖMYYDEN PARANTAMISEEN KOHD. ERILLSTYÖT	50 000		50 000	14 753	30	35 247	
ENERGIATEHOKK. PARANTAMISEEN KOHDISTUVAT ERILLISTYÖT	150 000		150 000	103 190	69	46 810	
PTS:N MUKAISET TYÖT	900 000	-100 000	800 000	344 946	43	455 054	
LVIS-PARANNUSTYÖT	200 000	100 000	300 000	205 857	69	94 143	
KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMINEN , ASIANTUNTIJAPALV.	100 000		100 000		0	100 000	
Tuuskodon peruskorjaus	100 000	600 000	700 000	715 250	102	-15 250	
Sahankulman muutostyöt	80 000	150 000	230 000	219 224	95	10 776	
Siivouskeskusten päivitys	50 000		50 000	10 619	21	39 381	
Syväkeräyssäiliöiden asentaminen jätteille	50 000		50 000	4 828	10	45 172	
Valvonta- ja lukitusjärjestelmät	100 000		100 000	48 256	48	51 744	
PIHAT	**100 000**	**0**	**100 000**	**74 413**	**74**	**25 587**	
Rakennusten pihainvestoinnit	100 000		100 000	74 413	74	25 587
