TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA OVK 1 2019

1.1.2019-
30.4.2019.2019

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Inv.nro	Hankkeen nimi	TA 2019	Muutos	MTA 2019	Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä
	RAKENNUKSET, PIHAT JA AIDAT YHTEENSÄ	12 300 000	0	12 300 000	897 525	7	11 402 475
	RAKENNUKSET	12 200 000	0	12 200 000	894 623	7	11 305 377
	KUNNANHALLITUS	450 000	0	450 000	652 027	145	-202 027
18310003	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, LVIS ja ikkunat	300 000		300 000	629 140	210	-329 140
18315011	Prijuutti	50 000		50 000	22 887	46	27 113
18310028	Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit	100 000		100 000		0	100 000
	KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	8 070 000	0	8 070 000	129 586	2	7 940 414
18310005	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO	5 000 000		5 000 000	102 705	2	
18310010	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	200 000		200 000	5 661	3	194 339
18310058	Pihaleikkivä. ja aidat säännösten mukaisiksi	30 000		30 000	462	2	29 538
18310072	Kirkonkylän koulu ja päiväkoti kampus	700 000		700 000	3 498	0	696 502
18315203	Martta Wendelin päiväkoti (ent. Mikkolan alueen pk)	440 000		440 000	4 641	1	435 359
18315204	Kellokosken koulun alapohjien korjaus	400 000		400 000	5 195	1	394 805
18315205	Kellokosken koulun pihojen peruskorjaus	250 000		250 000	7 424	3	242 576
18315206	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	60 000		60 000		0	60000
18315207	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; esirakentaminen (asuntomessut)Kuuluuko kunnallistekniikan puolelle?	430 000		430 000		0	430000
18315208	Riihikallion yhtenäiskoulun rakentaminen	500 000		500 000		0	500000
18315209	Jokela koulukeskus	60 000		60 000		0	60000

TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA OVK 1 2019

1.1.2019-
30.4.2019.2019

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Inv.nro	Hankkeen nimi	TA 2019	Muutos	MTA 2019	Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä
	KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	1 380 000	0	1 380 000	25 656	2	1 354 344
18315301	Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat	20 000		20 000		0	20 000
18315302	Uimahalli, lähtötelineiden uusiminen	40 000		40 000		0	40 000
18315303	Urheilukeskus	300 000		300 000		0	300 000
18315304	Rusutjärven koulun piha	100 000		100 000	104	0	99 896
18315305	Lepolan koulun lähiliikuntapaikka v. 2019. Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi.	300 000		300 000	9 855	3	290 145
18315306	Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen	250 000		250 000		0	250 000
18315307	Pääkirjaston peli/satuhuone	50 000		50 000	7 326	15	42 674
18315308	Halosenniemi	50 000		50 000		0	50 000
18315309	Klaavola	20 000		20 000		0	20 000
18315310	Ilmatorjuntamuseo	90 000		90 000	8 371	9	81 629
18315311	Rakennus 10	150 000		150 000		0	150 000
18315312	Mesta	10 000		10 000		0	10 000

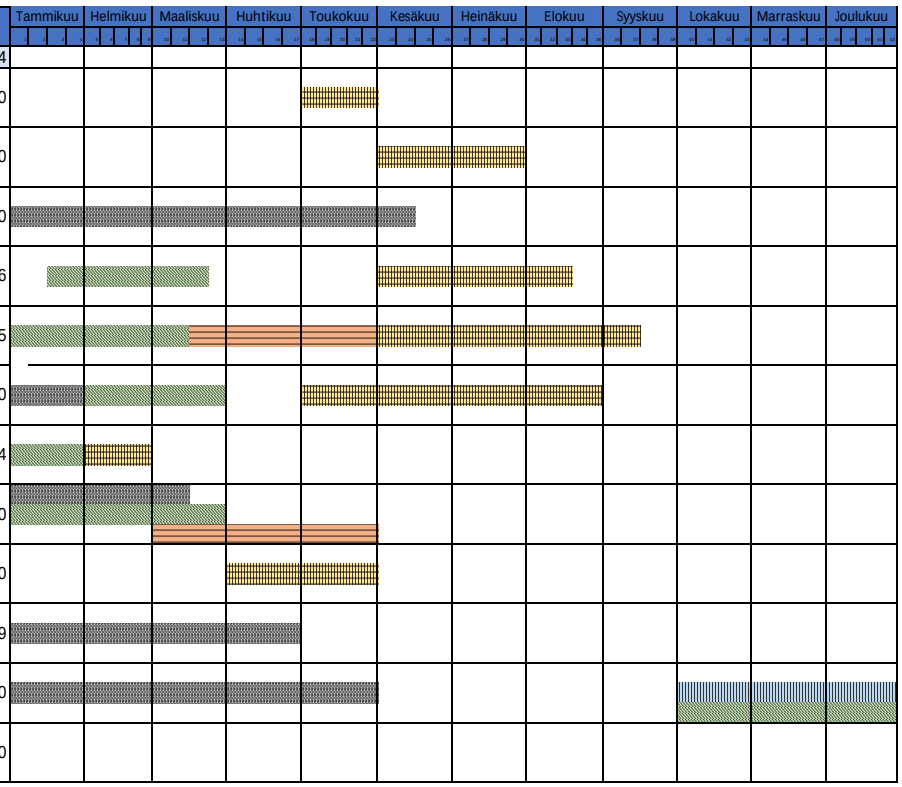

TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA OVK 1 2019

1.1.2019-
30.4.2019.2019

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Inv.nro	Hankkeen nimi	TA 2019	Muutos	MTA 2019	Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
	TEKNINEN LAUTAKUNTA	2 300 000	0	2 300 000	87 354	4													
18310007	Hyrylän koulukeskuksen korjauksia	100 000		100 000	3 139	3	96 861												
18310008	ANTTILAN ALUEEN RAKENNUKSET	100 000		100 000	1 969	2	98 031												
18310020	TALOAUTOMAATION PARANNUS- JA UUSIMISTYÖT	100 000		100 000	2 979	3	97 021												
18310023	VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOSINVESTOINNIT	50 000		50 000		0	50 000												
18310033	KIINTEISTÖJEN ESTEETÖMYYDEN PARANTAMISEEN KOHD. ERILLSTYÖT	35 000		35 000		0	35 000												
18310051	ENERGIATEHOKK. PARANTAMISEEN KOHDISTUVAT ERILLISTYÖT	150 000		150 000	3 874	3	146 126												
18310057	PTS:N MUKAISET TYÖT	1 365 000		1 365 000	27 709	2	1 337 291												
18310059	LVIS-PARANNUSTYÖT	200 000		200 000	38 950	19	161 050												
18310074	KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMINEN , ASIANTUNTIJAPALV.	200 000		200 000		0	200 000												
18310077	Ruotsinkylän koulun osittainen purku ja muutostyöt				8 734														
	PIHAT	100 000	0	100 000	2 902	3	97 098												
18310060	Rakennusten pihaonvestoinnit	100 000		100 000	2 902	3	97 098												
