TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1-12 / 2020

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelun valmistelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Hankkeen nimi	TA 2020	MTA 2020	1.1.2020-31.12.2020 Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä
RAKENNUKSET, PIHAT JA AIDAT YHT	11 790 000	10 040 000	7 918 855	79	2 121 145
RAKENNUKSET	11 690 000	9 940 000	7 820 576	79	2 119 424
KUNNANHALLITUS	250 000	250 000	127 346	51	122 654
Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, LVIS ja ikkunat	200 000	200 000	97 828	49	102 172
Prijuutti	50 000	50 000	29 518	59	20 482
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	7 590 000	5 090 000	3 863 200	76	1 226 800
Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO	3 800 000	1 300 000	1 194 500	92	105 500
Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	400 000	400 000	412 552	103	-12 552
Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	30 000	30 000	24 400	81	5 600
Kirkonkylän koulukampus	1 000 000	1 000 000	636 491	64	363 509
Martta Wendelin päiväkoti	1 400 000	1 400 000	1 051 596	75	348 404
Kellokosken koulun alapohjien korjaus	250 000	250 000	209 162	84	40 838
Rykmentinpuiston monitoimikampus	100 000	100 000	85 751	86	14 249
Riihikallion monitoimikampus	500 000	500 000	220 143	44	279 857
Jokela koulukeskus	50 000	50 000	18 565	37	31 435
Lahelan monitoimikampus	60 000	60 000	10 040	17	49 960

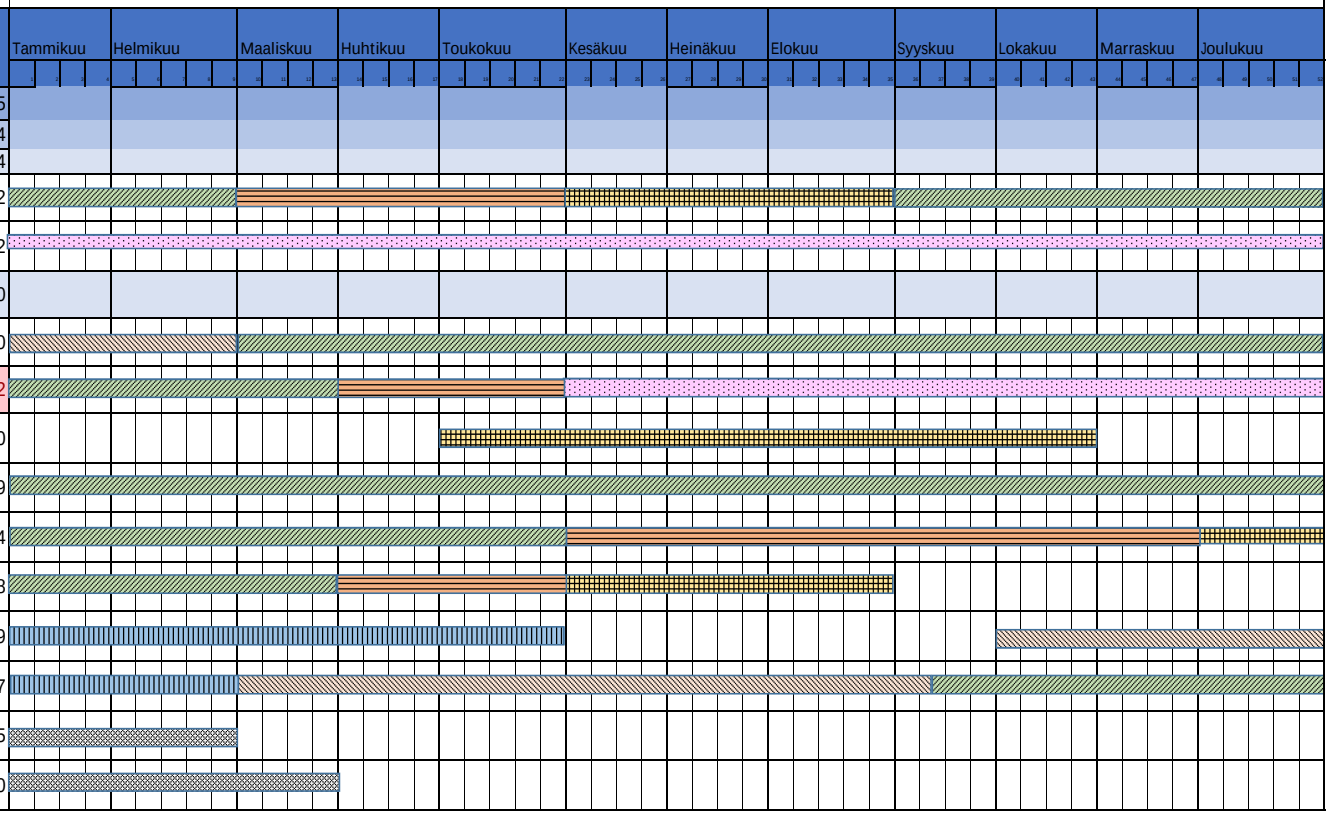

TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1-12 / 2020

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelun valmistelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen

Hankkeen nimi	TA 2020	MTA 2020	1.1.2020-31.12.2020 Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä
KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	1 540 000	1 540 000	1 179 115	77	360 885
Urheilukeskus	300 000	300 000	301 674	101	-1 674
Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen	15 000	15 000	15 545	104	-545
Halosenniemi	100 000	100 000	2 507	3	97 493
Ilmatorjuntamuseo	25 000	25 000	25 000	100	0
Rakennus 10	40 000	40 000	27 792	69	12 208
Mesta	10 000	10 000	5 500	55	4 500
Jokelan tiilitehtaan kehittäminen	50 000	50 000	22 913	46	27 087
Kirjasto, Kellokosken toimipiste	25 000	25 000	32 684	131	-7 684
Taidekasarmi	25 000	25 000	3 400	14	21 600
Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat	400 000	400 000	383 804	96	16 196
BMX-rata, hankesuunnitelma	50 000	50 000	7 299	15	42 701
Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat	150 000	150 000		0	150 000
Tuusulan jäähallin laatan ja jäähdytysputkiston uusiminen	350 000	350 000	350 700	100	-700

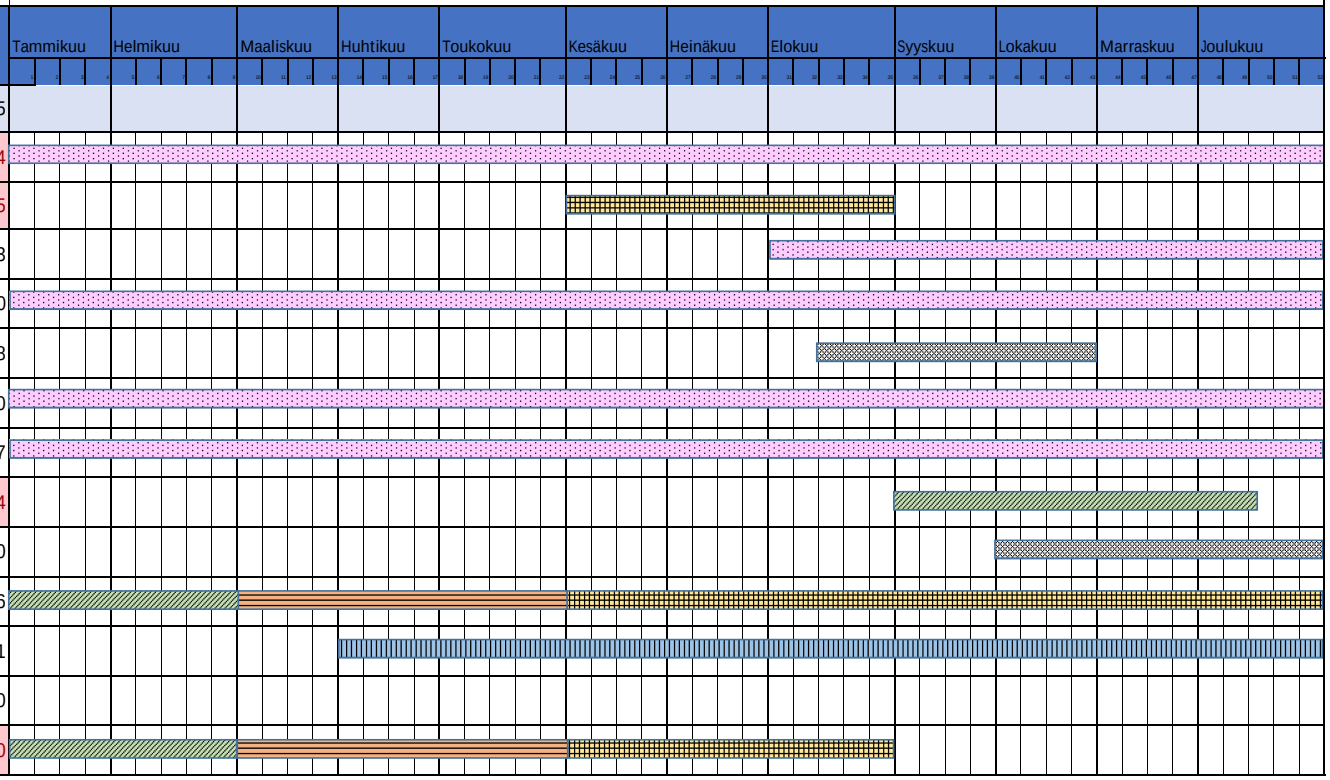

TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1-12 / 2020

tarvesuunnittelu | hankesuunnittelu | suunnittelun valmistelu | suunnittelu | rakentamisen valmistelu | rakentaminen | jaksottainen rakentaminen
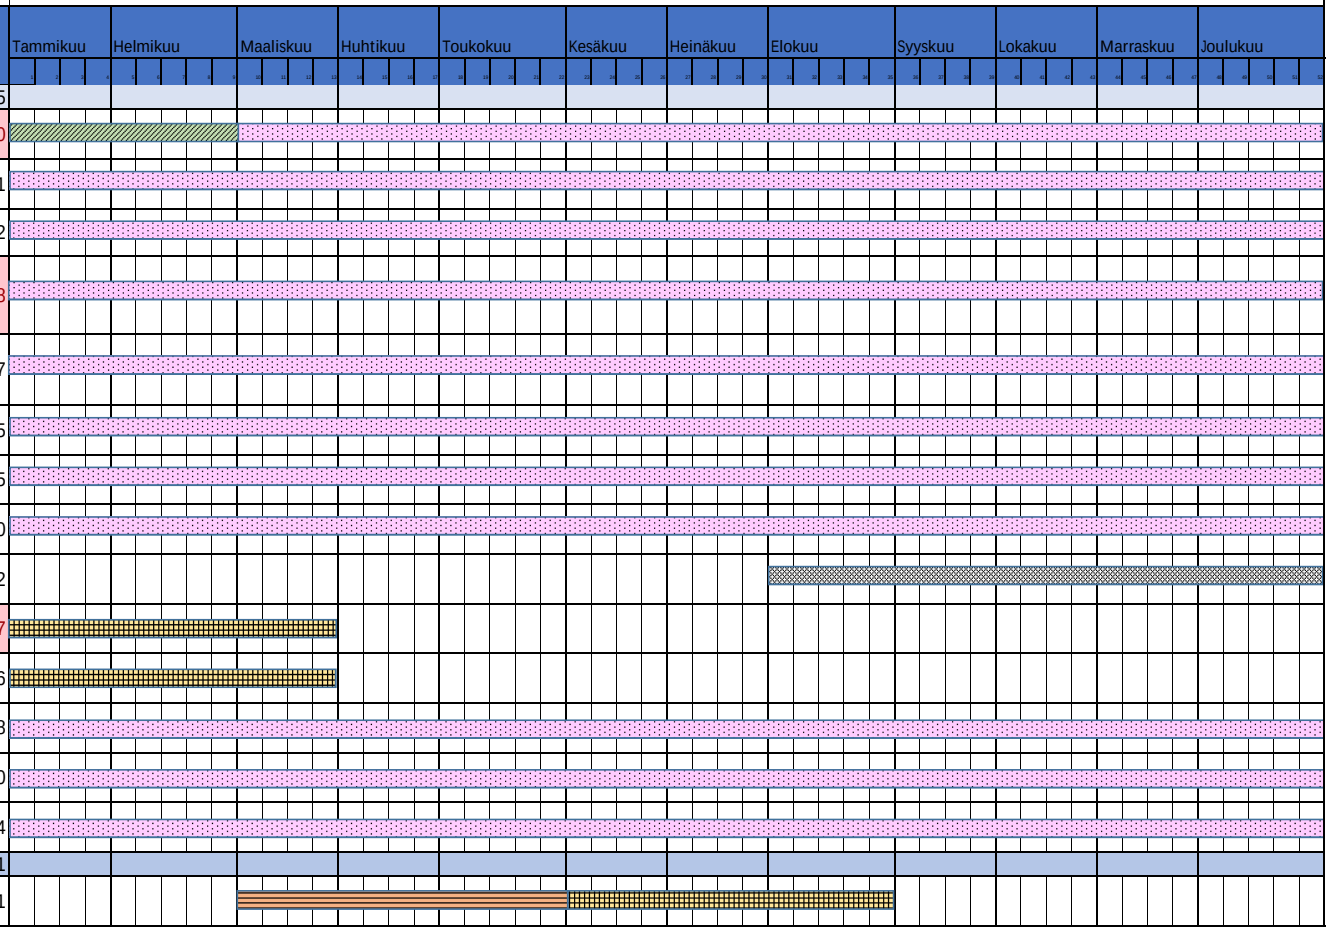
Hankkeen nimi	TA 2020	MTA 2020	1.1.2020-31.12.2020 Tot. Kust. €	Tot. Kust. %	Jäljellä
TEKNINEN LAUTAKUNTA	2 310 000	3 060 000	2 650 915	87	409 085
Hyrylän koulukeskuksen korjauksia	280 000	280 000	282 430	101	-2 430
ANTTILAN ALUEEN RAKENNUKSET	100 000	100 000	96 479	96	3 521
TALOAUTOMAATION PARANNUS- JA UUSIMISTYÖT	100 000	100 000	84 218	84	15 782
VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN AIHEUTTAMAT MUUTOSINVESTOINNIT	50 000	50 000	54 398	109	-4 398
KIINTEISTÖJEN ESTEETÖMYYDEN PARANTAMISEEN KOHD. ERILLSTYÖT	50 000	50 000	14 753	30	35 247
ENERGIATEHOKK. PARANTAMISEEN KOHDISTUVAT ERILLISTYÖT	150 000	150 000	138 635	92	11 365
PTS:N MUKAISET TYÖT	900 000	800 000	670 675	84	129 325
LVIS-PARANNUSTYÖT	200 000	300 000	226 550	76	73 450
KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMINEN , ASIANTUNTIJAPALV.	100 000	100 000	18 728	19	81 272
Tuuskodon peruskorjaus	100 000	700 000	731 407	104	-31 407
Sahankulman muutostyöt	80 000	230 000	219 224	95	10 776
Siivouskeskusten päivitys	50 000	50 000	21 652	43	28 348
Syväkeräyssäiliöiden asentaminen jätteill	50 000	50 000	10 370	21	39 630
Valvonta- ja lukitusjärjestelmät	100 000	100 000	81 396	81	18 604
PIHAT	100 000	100 000	98 279	98	1 721
Rakennusten pihainvestoinnit	100 000	100 000	98 279	98	1 721
