KUNTA	Talousarvio 19 540 000	KULUVA VUOSI Työohjelma	Toteuma	Toteuma %
	€€€	19 540 000	10 924 602,81	56 %
ETELÄ TUUSULA TIET JA LIIKENNE VÄYLÄT	**13 490 000**	**13 490 000**	**9 020 587**	
Autoasemankatu	600 000	600 000	93 791,61	16 %
Halkivaha 3	50 000	50 000	-	
Häriskivi	700 000	700 000	140 882,58	20 %
Linja-autoterminaali (matkakeskus)	1 340 000	1 140 000	471 590,23	41 %
Varuskunnantie	400 000	400 000	596 604,08	149 %
Tykkimiehenraitti	700 000	700 000	667 848,26	95 %
Ritarinaukio	150 000	150 000	-	
Puistokylä	50 000	50 000	-	
Puustellinmetsä			33 069,11	
Metsävadelmantie			33 069,11	
Kivikiila, Koskenmäentie	200 000	200 000	-	
Tuuskoto	100 000	100 000	-	
Pellavamäki	800 000	800 000	554 048,47	69 %
Lahelanpelto2	350 000	350 000	196 837,01	56 %
Lahelanpelto3	150 000	150 000	-	
Mattila2	600 000	600 000	117 385,75	20 %
Urkka-aukio	500 000	500 000	896 106,08	179 %
Focus/Sammonmäki	150 000	150 000	-	
Kehä4	150 000	150 000	-	
Sula 3 (Laajennusalueet Sula)	6 000 000	6 000 000	3 723 017,68	62 %
Rykmentinportti & tp-alue Itäinen	200 000	200 000	4 266,13	2 %
Kirkkotie jk/pp järjestelyt	300 000	300 000	211 272,56	70 %
Palvelukeskuksen johtosiirrot	0	200 000	583 109,08	292 %
Erittelemätön Etelä-Tuusula			140 882,58	
Rykmentin puistotie 2-vaihe (Linja-autoterminaalia)			255 143,79	
Ristikiven LP-alue			20 096,37	
Rykmentinpuisto tp-alue itäosa			1 053,00	
Puustellinniitynpolku			206,55	
Rykmentinpuisto III katu			12 930,30	
Rykmentinpuiston tp-alue, baana			134 059,80	
Rykmentinpuiston ja urheilupuiston…			33 144,74	
Lahelanorsi-koulu			91 172,03	
Ristkiventien jkpp jatke			4 500,00	
Pakkasraitin jkpp Huurrekuja-K			4 500,00	
			-	
			-	
KELLOKOSKI TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT	**1 350 000**	**1 350 000**	**181 270**	
Joenranta	1 300 000	1 300 000	169 897,39	13 %
Seppäinpuisto	50 000	50 000	-	-
Erittelemätön Kellokoski			11 372,50	
JOKELA TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT	**1 180 000**	**1 180 000**	**312 122**	
Peltokaaren puistotie	200 000	200 000	79 520,16	40 %
Blennerintie	170 000	170 000	-	-
Lepola 3	100 000	100 000	-	-
Kappalaisen kaari/Lylykuja (Kartano 1)	120 000	120 000	150 179,69	125 %
Jokelan asemapolun alue	100 000	100 000	-	-
Vallun tp-alue	90 000	90 000	-	-
Opintie jk/pp	400 000	400 000	1 671,77	0,42 %
Härkäkaivon alue			78 707,25	
Erittelemätön jokela			233,49	
Uunimiehenpolku			1 589,40	
Vaunutehtaan alue			220,00	
MUUT KOHTEET TIET JA LIIKENNEVÄYLÄT	**1 060 000**	**1 060 000**	**178 134**	
Liikennevalojen saneeraus	20 000	20 000	-	-
Katuvalojen saneeraus	250 000	380 000	129 795,34	34 %
Katuvalokeskusten uusinta	50 000	50 000	27 427,24	55 %
Valaistuksen ohjausjärjestelmän uusinta	300 000	200 000	-	
viitoitus ja opastus	10 000	10 000	-	
Liikenneturvallisuuden parantaminen, pienet kohteet	40 000	40 000	-	
Linja-autopysäkit	180 000	180 000	-	
Ympäristön parantaminen	20 000	20 000	16 981,75	85 %
Puupylväiden uusinta	30 000	0		
Liikennemerkkien uusiminen	50 000	50 000	3 930,00	8 %

Työ-ohjelman värikoodit selityksineen

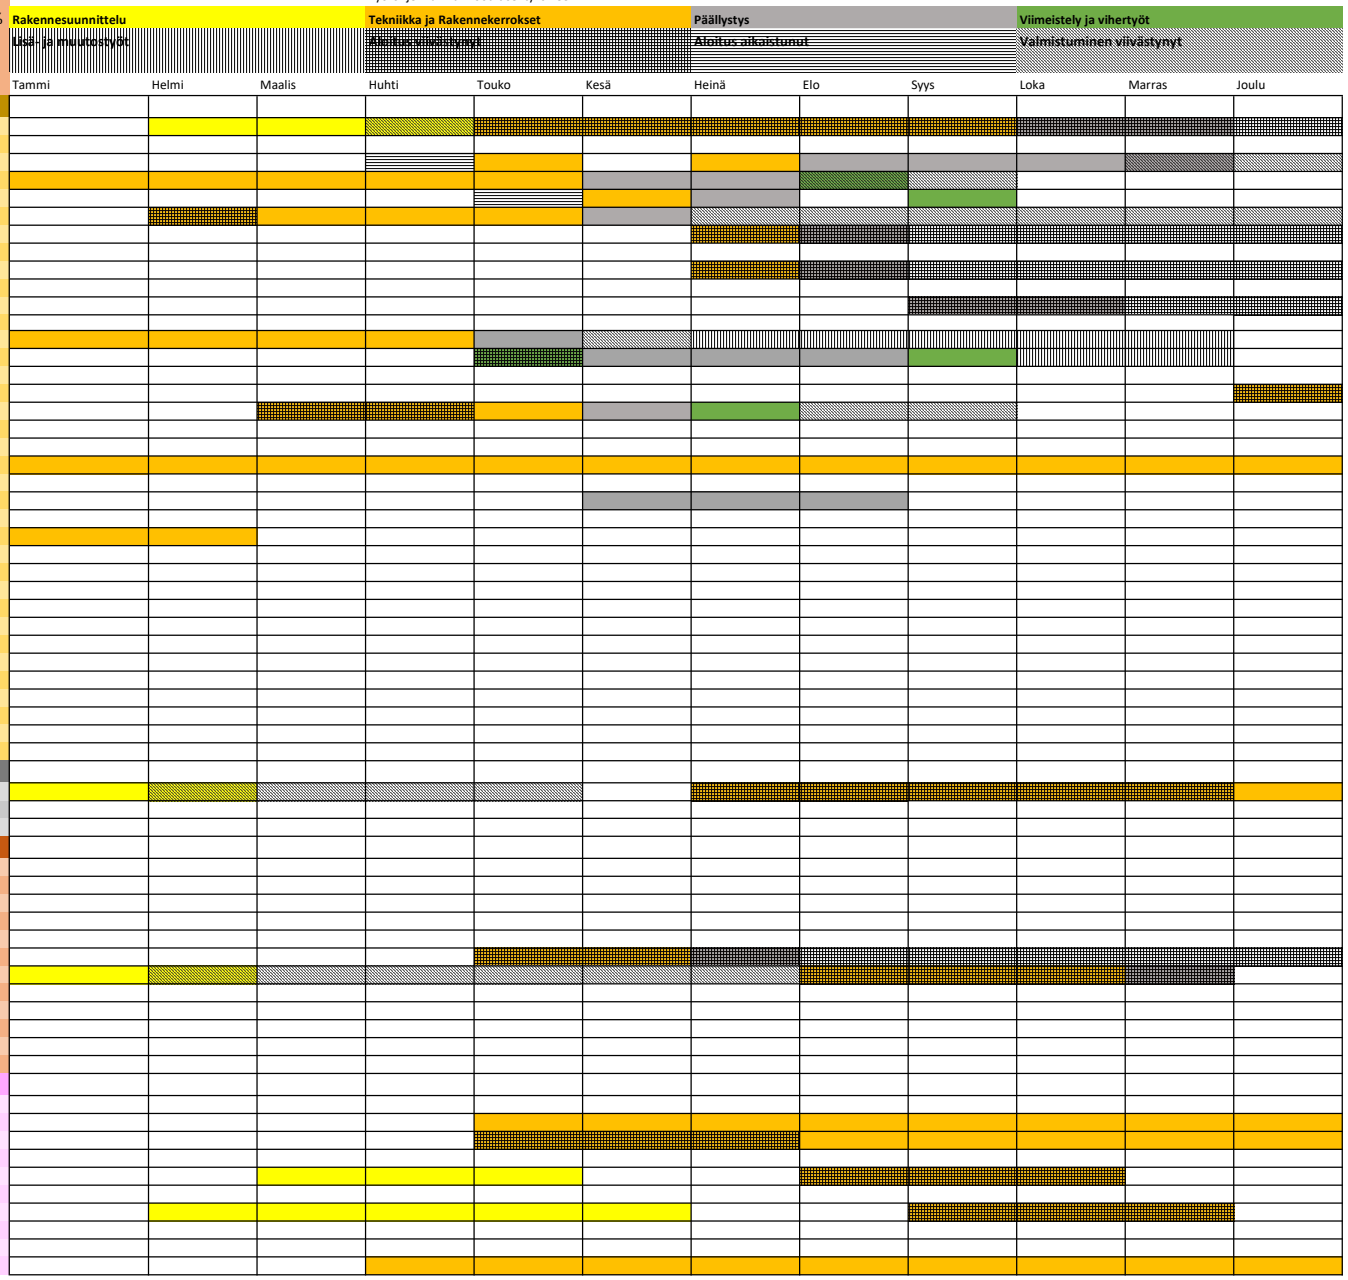
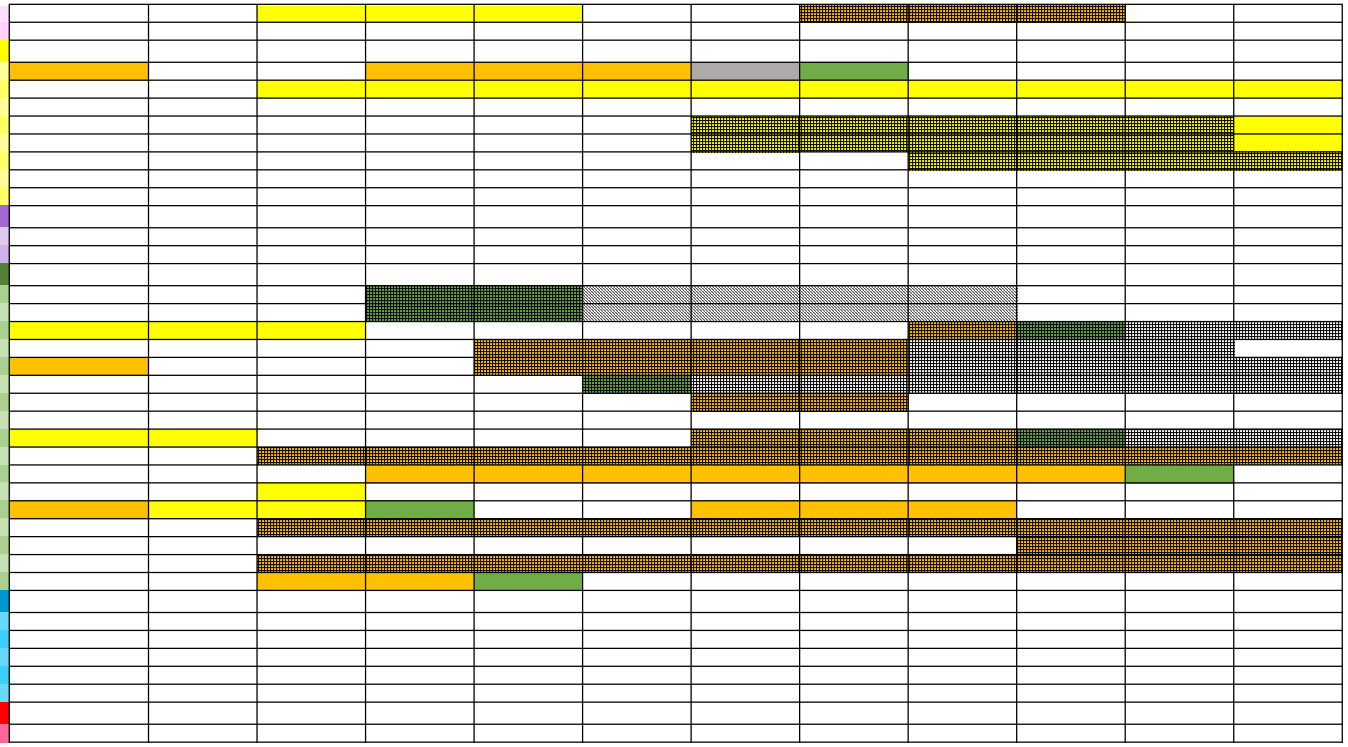
Ajopuomit kevytväylille	40 000	40 000	-	-
Vesistöt	70 000	70 000	-	-
Muut pitkävaikutteiset menot	930 000	**930 000**	**481 805**	
Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	300 000	300 000	473 396,01	158 %
Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	200 000	200 000	3 014,74	2 %
Virtalantie/Höyhensaarentie liittymä mt 1403	120 000	120 000	-	-
Pääradan alikulku Peltokaaressa	120 000	120 000	-	-
Jokelantien alikulku Peltokaaressa	90 000	90 000	-	-
Mt 11671 jk/pp (linjatie)	100 000	100 000	-	-
Koskenniskantien pysäköintialue			5 394,57	
MUUT	**20 000**	**20 000**		
		20 000		
PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT	**2 270 000**	**2 270 000**	**947 034**	
Häriskivi	100 000	100 000	-	-
Pellavamäki			7 862,35	
Patteristonpuisto ja -polku	200 000	200 000	13 125,00	7 %
Pitkospuut Koskenmäentie-Kalamestarintie	300 000	300 000	916,50	0,31 %
Valkamapuiston valaistus	200 000	200 000	18 075,00	9 %
Hankkijanojan kunnostus	45 000	45 000	1 209,90	3 %
Piiliojan kunnostus	30 000	30 000	-	-
Natura-alueen perusparannus	40 000	40 000	-	-
Agustanpuisto	250 000	250 000	760,00	0,30 %
Etelä-Tuusulan muut puistot	70 000	70 000	450,50	1 %
Lankalenkki	550 000	550 000	525 357,41	96 %
Koululammenpuisto	50 000	50 000	-	
Apteekinlampi	300 000	300 000	338 624,17	113 %
Jokela pienet saneerauskohteet	20 000	20 000	-	-
Joenranta	100 000	55 000	-	-
Kellokoski pienet saneerauskohteet	15 000	15 000	-	-
Puustellinmetsän Koirapuisto	0	45 000	40 653,10	90 %
VESISTÖT	**70 000**	**70 000**	**115 772,44**	
Keravanjoki	20 000	20 000	-	
Palojoki	20 000	20 000	-	
Tuusulanjärvi			12 127,30	
Rutusjärvi	30 000	30 000	37 933,77	126 %
Tuusulanjärven ympäristö			65 711,37	
Rakennusten pihainvestoinnit	**100 000**	**100 000**		
Erillinen työohjelma
